

**CONGRESSO  
PETROBRAS DE  
SMS E CLIMA 2021**

# *Implantação de Padronização do Processo de Planejamento de PT no GPI do TABR*


Área: TRANSPETRO - UN-BAES - TEVIT  
Data: Novembro/2021




# COMO IMPLANTAR O SPT/LIBRA E OS PROCEDIMENTOS DE LIBERAÇÃO DE SERVIÇO COM EFICIÊNCIA



## SITUAÇÃO PROBLEMA

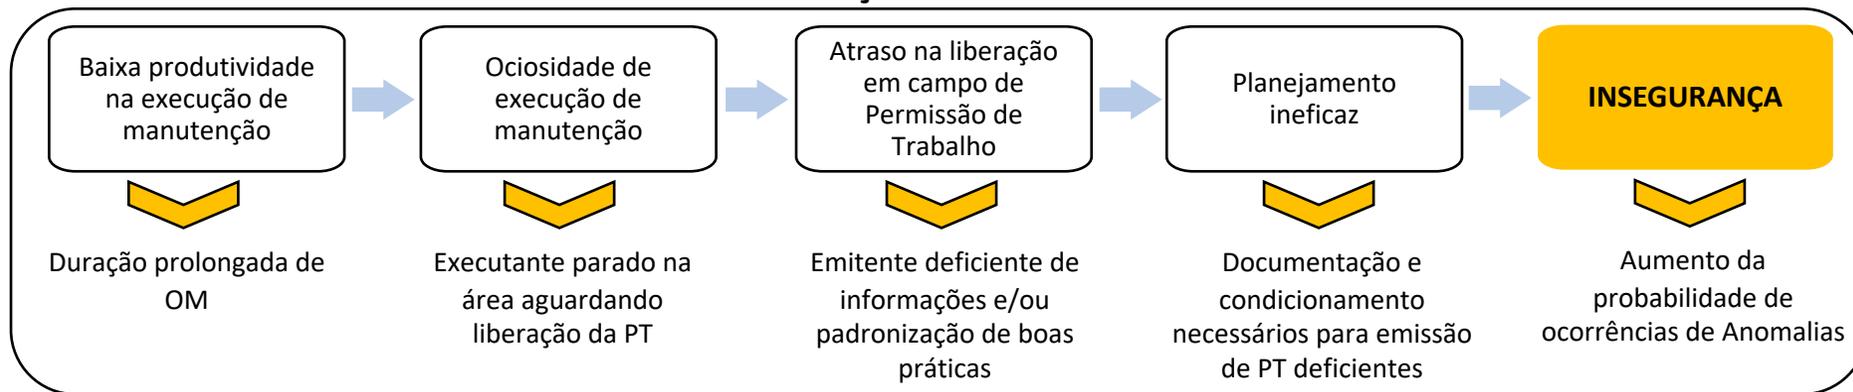

## FLUXOGRAMA IMPLEMENTADO DO PROCESSO

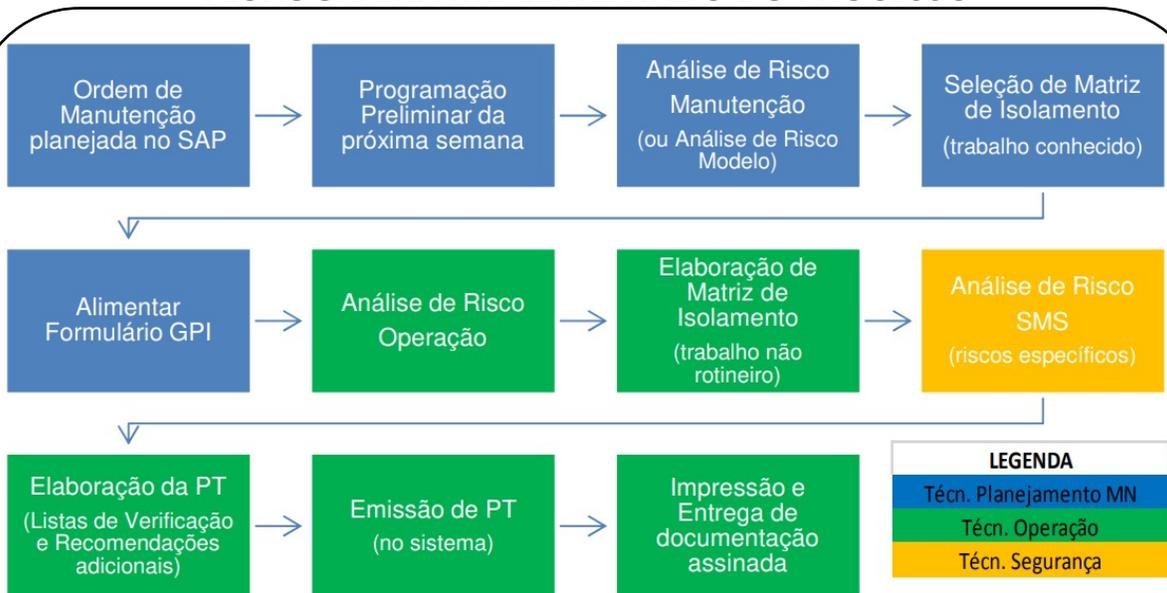

## MELHORIAS IMPLEMENTADAS

- Padronização Fluxograma do processo;
- Análise de risco modelo;
- Detalhamento das ordens (Lista de tarefa - SAP) com foco no entendimento do executante e emitente;
- Agrupamento de atividades (Operações no SAP) de mesmo risco em uma mesma Operação;
- Atualização diária do cumprimento da programação entre Fiscal e Programador;
- Programação antecipada para o Supervisor e Operação (antecipa condicionamentos operacionais);
- Reemissão de PT após término da jornada de trabalho do executante;
- Aplicação de LIBRA no turno noturno;

## RESULTADOS

- UMA SEMANA DE ANTECIPAÇÃO DE PLANEJAMENTOS PRONTOS
- REDUÇÃO DE RETRABALHOS DE PLANEJAMENTOS DE 13,6% PARA 1,29%;
- AUMENTO DAS LIBERAÇÕES DE PT EM CAMPO NOS HORÁRIOS PROGRAMADOS = 45% DAS PT's LIBERADAS ENTRE 8H E 9H;
- REDUÇÃO DE ANOMALIAS DE SEGURANÇA DE PROCESSO DE 6 EM 2017 PARA UMA EM 2020.





*Obrigado!*

